

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 159
ze dne 6.2.2023

*k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi HMP a obchodní společností COLAS CZ, a.s.,
IČO: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 a úpravě rozpočtu
na rok 2023*

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

informaci o návrhu Dohody o narovnání, jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a o důvodu jejího uzavření, který je uveden v důvodové zprávě a jejích přílohách

II. schvaluje

1. uzavření Dohody o narovnání mezi HMP a obchodní společností COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá

1. MHMP - INV MHMP

1. uzavřít Dohodu o narovnání dle bodu II.1. tohoto usnesení

Termín: 31.3.2023

2. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.2. tohoto usnesení

Termín: 10.2.2023

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátora RNDr. Jana Plamínková
Tisk: R-46544
Provede: MHMP - INV MHMP, MHMP - ROZ MHMP
Na vědomí: odborům MHMP



MHMPXPIZHNU9

Dohoda o narovnání **DOH/21/08/007512/2022**

Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná – 4. část

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahou

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE] ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci ze dne 8. 12. 2022

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Jelikož existují mezi Objednatelem a Zhotovitelem ke dni podpisu této Dohody sporná práva a povinnosti popsané v článku II. této Dohody a také z důvodu, aby obě strany předešly nákladům spojeným s vedením možného soudního řízení v této věci, uzavírají tuto Dohodu o narovnání (dále též jen „Dohoda“), jejímž účelem je úprava veškerých vzájemných sporných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006946/2020 ze dne 2. 12. 2020.

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 2. 12. 2020 smlouvu o dílo DIL/21/08/006946/2020 k provedení Stavby č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná – 4. část (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla rekonstrukce a stavební úpravy stávajících chodníků a zastávek MHD BUS, výstavba nových parkovacích stání, přeložka veřejného osvětlení v délce trasy cca 160 m včetně souvisejících činností nezbytných pro dosažení účelu Smlouvy o dílo (dále jen „Dílo“).
2. Cena za Dílo byla mezi Smluvními stranami smluvně ve výši 10 879 653,36 Kč bez DPH, tj. 13 164 380,57 Kč včetně DPH ve výši 21%.

II. Sporná práva

1. Touto Dohodou upravují její účastníci podle § 1903 a násl. občanského zákoníku všechny vzájemná práva a povinnosti tvořící k dnešnímu dni obsah jejich právního vztahu ze Smlouvy o dílo uvedené shora v čl. I a z odpovědnosti z ní vyplývající tak, jak je uvedeno níže.
2. V průběhu provádění Díla bylo na základě nových požadavků MČ Praha 19 a MČ Praha Vinoř doplněno dílo o následující vícepráce:
 - a. Změna v úpravě podloží - vlivem existence podzemních sítí nelze aplikovat zlepšení zemin vápněním za pomoci zemní frézy (dle původního předpokladu v zadávací dokumentaci). Z tohoto důvodu byla navržena výměna nevhodného materiálu za materiál vhodný.
 - b. Výměna obrub - z důvodu zachování dlouholetého bezproblémového užívání stavby a zajištění její kvality byla navržena výměna zahradních betonových vibrolisovaných obrub š. 5 cm za betonové vibrolité silniční šířky 8 cm. Touto změnou se prodlouží životnost stavby.
 - c. Na základě požadavku MČ Praha 19 je u stávající BUS Důstojnické domy doplněn nový BUS přístřešek.
 - d. Na základě požadavku Odboru ŽP ÚMČ Praha 19 byl proveden v lesním úseku bezpečnostní prořez stromu. Větve zasahovaly do profilu cyklostezky a zakrývaly lampy VO.
 - e. Prodloužení chodníku - na základě požadavku MČ Praha - Vinoř bylo realizováno prodloužení chodníku při severní straně ul. Mladoboleslavská.
 - f. Prodloužení propustku - výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél Komunitního centra Prales si vynutila prodloužení stávajícího propustku pod stávajícím sjezdem. Prodloužením propustku a zřízení nového (kratšího) čela propustku umožnilo dodržet bezpečnostní odstup příkopu a provozu nemotorové dopravy.
 - g. Osazení 2 ks dopravních zrcadel – bylo provedeno na základě požadavku MČ Praha 19 - zajištění řádného rozhledu při napojení z areálu Komunitní centrum Prales na hlavní pozemní komunikaci osazením 2 ks vyhřívacích zrcadel.
 - h. Změna dopravního značení - na základě požadavku MČ Praha Vinoř - změna dopravního značení při označení chodníku a stezky, zřízení dopravních majáků u cyklopřejezdu přes MK Mladoboleslavská.

3. V průběhu provádění Díla byly na základě nových požadavků MČ Praha 19 a MČ Praha Vinoř vypuštěny z realizace díla méněpráce:
 - a. Odpočet BUS zastávek - odpočet za neprováděné BUS přístřešky - 2 ks.
 - b. Neprovedené položky a úpravy v rámci VO z důvodu změny způsobu zapojení.
4. Na základě výše uvedených víceprací a méněprací došlo ke změně Předmětu Díla, Ceny díla, konkrétně k jeho rozšíření o nutné vícepráce v hodnotě 3 202 564,68 Kč bez DPH a k jeho zmenšení o méněpráce v hodnotě (mínus) 1 088 135,83 Kč bez DPH. Celkově se jedná o navýšení ceny Díla (vícepráce – méněpráce) v hodnotě **2 114 428,85 Kč bez DPH** ve členění **2 163 156,85 Kč bez DPH** pro část Díla ve správě MČ a **-48 728,00 Kč bez DPH** pro část Díla ve správě THMP.
5. Smluvní strany však včas neuzavřely dodatek ke Smlouvě o dílo, který by zohledňoval výše uvedené nutné změny. Dílo bez vad a nedodělků bylo Zhotovitelem předáno a Objednatelům převzato na základě předávacího protokolu ze dne 11. 7. 2022.
6. Objednatel je dále povinen na základě této Dohody zaplatit Zhotoviteli za provedené a neuhrazené práce dle Smlouvy o dílo (tzn. do fakturace provedených stavebních prací) ve výši **1 394 159,18 Kč bez DPH tj. 1 686 932,61 Kč vč. DPH** ve členění **1 147 829,14 Kč bez DPH tj. 1 388 873,26 Kč vč. DPH** pro část Díla ve správě MČ a **246 330,04 Kč bez DPH tj. 298 059,35 Kč vč. DPH** pro část Díla ve správě THMP.
7. Hodnota provedených a neuhrazených prací a hodnota dodatečných víceprací činí celkem **3 508 588,03 Kč bez DPH** v členění **3 310 985,99 Kč bez DPH** pro část Díla ve správě MČ a **197 602,04 Kč bez DPH** pro část ve správě THMP.

III.

Narovnání

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedené a neuhrazené práce a za provedené dodatečné vícepráce částku celkem ve výši **3 508 588,03 Kč bez DPH tj. 4 245 391,52 Kč** včetně DPH (slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc tři sta devadesát jedna korun českých padesát dva haléřů) Tato částka bude fakturována samostatně dle objektů budoucích správců - provozovatelů v rámci objektů, a to v členění **3 310 985,99 Kč bez DPH tj. 4 006 293,05 Kč vč. DPH** pro část Díla ve správě MČ a **197 602,04 Kč bez DPH tj. 239 098,47 Kč vč. DPH** pro část ve správě THMP.
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti této Dohody. Splatnost faktur činí 30 dní od jejich doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
3. Uhrazením částky ve výši **4 245 391,52 Kč** včetně DPH Objednatelům ve prospěch Zhotovitele budou veškerá sporná práva a povinnosti uvedené v čl. II této Dohody vypořádány. Tato částka je konečná a žádná ze stran nebude po uzavření této Dohody v této souvislosti požadovat úrok z prodlení, smluvní pokutu nebo jiné obdobné plnění.
4. Faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelům. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu

- bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Dohody
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
5. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Dohodě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ni výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Dohody a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této Dohody.
3. Tato Dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto Dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních stran na téže listině.
5. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že narovnání provedené touto Dohodou představuje úplné a konečné vypořádání všech jejich vzájemných práv a povinností souvisejících s cenou provedených víceprací a neprovedených méněprací specifikovaných v článku II. této Dohody, Smluvní strany výslovně prohlašují, že nebudou v této souvislosti uplatňovat žádné další či související nároky.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ust. čl. II. této Dohody. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006946/2020 touto Dohodou neupravené se nemění.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Dohody, číselné značení této Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
9. V souladu s ust. § 43 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření této Dohody schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. ze dne
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí Objednatel.
11. Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Dohody a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dohodu), a to dnem připojení posledního z nich.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tisni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dohody k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dohodu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla a kalkulace Dohody - rozpočet

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3 – Potvrzení změny PoZ 1

Příloha č. 4 – Plná moc Ing. Pavla Kellera

V Praze dne:

Za Objednatele:

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

Podpis: _____

Hlavní město Praha

Ing. Petr Kalina, MBA

Ředitel odboru investičního MHMP

Podpis: _____

COLAS CZ, a.s.



ředitel oblasti Sever

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: 201211774 - TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná - 4.část						
Objekt: 999 - ZBV1						
Etapa: 999 - ZBV1.a - Změna v úpravě podloží						
Podetapa: 1 - Méněpráce						
001	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m ²	-2 591,000000	m ²	95,00	-246 145,00
002	58530159	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté	-104,741000	t	2 971,00	-311 185,51
Součet za Podetapa: 1 - Méněpráce					-557 330,51	
Podetapa: 2 - Vícepráce						
001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	1 049,679000	m ³	123,00	129 110,52
002	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	349,893000	m ³	27,00	9 447,11
003	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	165,564511	m ³	359,00	59 437,66
004	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1 049,679000	m ³	55,00	57 732,35
005	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	10 496,790000	m ³	11,00	115 464,69
006	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	1 049,679000	m ³	41,00	43 036,84
007	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	1 889,422200	t	140,00	264 519,11
008	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	8 294,920000	m ²	136,00	1 128 109,12
009	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvoosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	3 425,300000	m ²	88,90	304 509,17
010	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	3 152,069600	t	36,00	113 474,51
Součet za Podetapa: 2 - Vícepráce					2 224 841,07	
Celkem	Etapa: 999 - ZBV1.a - Změna v úpravě podloží				1 667 510,55	
Etapa: 999 - ZBV1.b - BUS přístřešek						
002	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	2,000000	m ³	2 896,00	5 792,00
001	988R0001	Přístřešek (Volmut V3 s bočnicemi) - dodávka a montáž	1,000000	KUS	134 160,00	134 160,00
Součet za Etapa: 999 - ZBV1.b - BUS přístřešek					139 952,00	
Etapa: 999 - ZBV1.c - Změna obrub						
Podetapa: 1 - méněpráce						
001	592170111	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	-2 078,760000	m	57,00	-118 489,32
Součet za Podetapa: 1 - méněpráce					-118 489,32	
Podetapa: 2 - vícepráce						
001	592170160	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	2 078,760000	m	129,00	268 160,04
Součet za Podetapa: 2 - vícepráce					268 160,04	
Celkem	Etapa: 999 - ZBV1.c - Změna obrub				149 670,72	
Etapa: 999 - ZBV1.d - Bezpečnostní prořez stromů						
001	1	Bezpečnostní prořez stromů, vč. odvozu a likvidace odpadu	1,000000	Kompl	69 336,00	69 336,00
002	9999	Haléřové vyrovnání	1,000000	kompleť	0,01	0,01
Součet za Etapa: 999 - ZBV1.d - Bezpečnostní prořez stromů					69 336,01	
Etapa: 999 - ZBV1.E - Prodloužení chodníku						

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
1 - Zemní práce					
011	00572470	osivo směs travní univerzál	2,100000 kg	121,00	254,10
001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	204,900000 m2	61,40	12 580,86
013	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	15,400000 m2	67,30	1 036,42
002	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	45,500000 m2	90,00	4 095,00
014	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	15,400000 m2	78,70	1 211,98
003	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	16,800000 M3	205,00	3 444,00
004	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	47,535000 M3	259,00	12 311,57
005	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD	237,675000 M3	19,80	4 705,97
006	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	47,535000 M3	138,00	6 559,83
007	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	25,200000 t	140,00	3 528,00
008	181351105	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	131,000000 m2	82,90	10 859,90
010	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	139,000000 m2	18,70	2 599,30
012	181951102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	157,500000 m2	40,00	6 300,00
Součet za 1 - Zemní práce					69 486,92
5 - Komunikace pozemní					
001	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	71,940000 m2	183,00	13 165,02
002	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	91,850000 m2	232,00	21 309,20
009	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	15,400000 m2	283,00	4 358,20
003	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	16,000000 m2	92,00	1 472,00
005	592450180	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	81,090000 m2	270,00	21 894,30
008	592450200	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	48,754000 m2	350,00	17 063,90
006	5924VP3080	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	4,080000 m2	193,00	787,44
004	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	83,500000 m2	283,00	23 630,50
007	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	48,100000 m2	368,00	17 700,80
Součet za 5 - Komunikace pozemní					121 381,36
9 - Ostatní konstrukce a práce					
005	592170160	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	84,400000 m	129,00	10 887,60
006	592170170	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	14,000000 m	141,00	1 974,00
007	592170290	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	20,000000 m	138,00	2 760,00
001	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1,000000 KUS	257,00	257,00
002	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	1,000000 KUS	337,00	337,00
003	914R2	Zpětná montáž značky "Vinoř" na sloupky s betonovým základem	1,000000 kpl	5 000,00	5 000,00
004	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	118,400000 m	251,00	29 718,40
008	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1,000000 KUS	369,00	369,00
009	966R1	Odstranění značky "Vinoř" vč. vybourání betonové patky	1,000000 kpl	2 000,00	2 000,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					53 303,00
997 - Přesun sutě					
001	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	36,309000 t	42,70	1 550,39
002	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	508,326000 t	9,82	4 991,76
003	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	0,300000 t	47,90	14,37
004	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	4,200000 t	12,60	52,92
005	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	0,300000 t	164,00	49,20
006	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	0,300000 t	710,00	213,00
007	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	32,613000 t	450,00	14 675,85

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
008	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	3,696000 t	140,00	517,44
	Součet za	997 - Přesun sutě			22 064,94
Celkem	Etapa: 999 - ZBV1.E - Prodloužení chodníku				266 236,22
	Etapa: 999 - ZBV1.F - Prodloužení propustku				
001	919R3	Prodloužení propustku, zřízení čela, obklad kamenem a terénní úpravy	1,000000 Komp	19 065,00	19 065,00
	Součet za	Etapa: 999 - ZBV1.F - Prodloužení propustku			19 065,00
	Etapa: 999 - ZBV1.G - Osazení 2 ks dopravních zrcadel				
001	R999	2x Vyhřívané dopravní zrcadlo M+D	1,000000 ks	57 579,35	57 579,35
	Součet za	Etapa: 999 - ZBV1.G - Osazení 2 ks dopravních zrcadel			57 579,35
	Etapa: 999 - ZBV1.H - Odpočet BUS zastávek				
001	988R0001	Přístřešek (Volmut V3 s bočnicemi) - dodávka a montáž	-2,000000 KUS	134 160,00	-268 320,00
	Součet za	Etapa: 999 - ZBV1.H - Odpočet BUS zastávek			-268 320,00
	Etapa: 999 - ZBV1.I - Změna dopravního značení a dopravní majáky				
002	404VP0001	značka dopravní	12,000000 KUS	926,00	11 112,00
004	404VP0002	sloupek pro dopravní značku s beton. patkou	3,000000 KUS	1 197,00	3 591,00
001	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	17,000000 KUS	257,00	4 369,00
003	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	3,000000 KUS	337,00	1 011,00
006	R912411211	2x Pružný výstražný maják plastový D 600 mm neprosvětlený	1,000000 KUS	42 044,00	42 044,00
	Součet za	Etapa: 999 - ZBV1.I - Změna dopravního značení a dopravní majáky			62 127,00
	Etapa: 999 - ZBV1.J - Odpočet položek VO				
	Podetapa: 1 - Méněpráce				
001	21000R005	přepojení a vypnutí sítě vč. doзору PRE	-1,000000 kpl	9 409,00	-9 409,00
004	2101R001	zapínací místo ZM1 ZB Fe 3D vč. zděného soklu	-1,000000 ks	80 566,00	-80 566,00
002	2102R001	Kabelová skříň SR 502 vč. jističů a elektroměru, vč. zděného pilíře	-1,000000 ks	51 010,00	-51 010,00
003	2102R801	demontáž stávající kabelové skříňe vč. odvozu a polatku za skládku	-1,000000 ks	3 011,00	-3 011,00
	Součet za	Podetapa: 1 - Méněpráce			-143 996,00
	Podetapa: 2 - Vícepráce				
001	21000R002	Revize	1,000000 kpl	14 702,00	14 702,00
002	2101R001	Dělicí skříň	1,000000 ks	80 566,00	80 566,00
	Součet za	Podetapa: 2 - Vícepráce			95 268,00
Celkem	Etapa: 999 - ZBV1.J - Odpočet položek VO				-48 728,00
CELKEM	Objekt: 999 - ZBV1				2 114 428,85

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

**Konečná specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
dle DIL/21/08/006946/2020 včetně víceprací dle DOH/21/08/007512/2022**

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		THMP	MČ Kbely	MČ Vinoř				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 100 Komunikace	10 287 774,75		3 879 023,17	6 408 751,58				
SO 400 Veřejné osvětlení	1 683 859,46	1 683 859,46						
SO 500 VRN	384 256,00		192 128,00	192 128,00				
SO 701 DIO	638 192,00		214 224,00	423 968,00				
Celkem zákl. cena	12 994 082,21	1 683 859,46	4 285 375,17	7 024 847,58				
DPH 21 %	2 728 757,26	353 610,49	899 928,79	1 475 217,99				
Cena stavby vč. DPH	15 722 839,47	2 037 469,95	5 185 303,96	8 500 065,57				

Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná - 4. část		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 1	
PoZ vystavil:		Datum: 27. 4. 2022	
PoZ č. na NOZ č.		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006946/2020 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 2 114 428,85 Kč bez DPH, tj. 19,43 % ceny díla bez DPH, z toho odpočty činí -1 088 135,83 Kč bez DPH a přípočty činí 3 202 564,68 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změny je 39, 44 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):			
Nová cena díla (bez DPH):			
Důvod ke změně:			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Poznámka:			
Datum: 20.05.2022	Datum: 17.05.2022	Datum: 19.5.2022	



2023/008/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva [redacted] a člen představenstva [redacted]

tímto uděluje

plnou moc

[redacted]
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever

[redacted]
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 35 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 5 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;




2023/008/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze, dne 8.12.2022

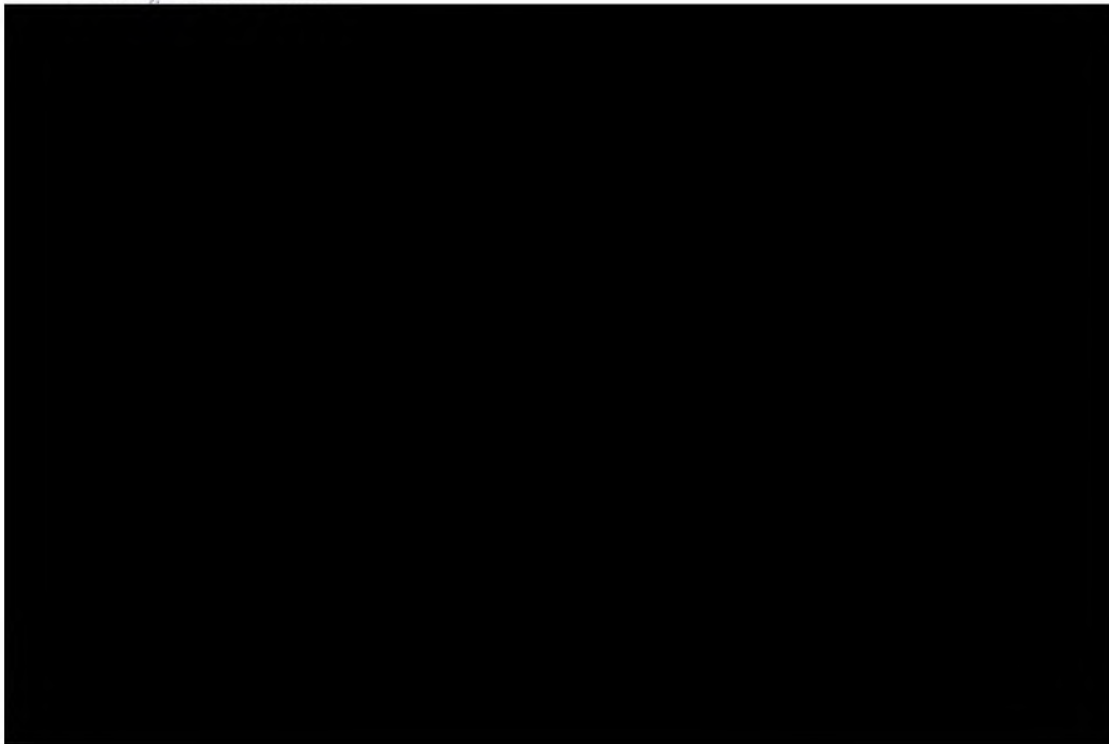

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - INV	003145	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0221	4 245,40
Celkem							4 245,40

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)						
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
INV MHMP	0003145	TV Vinoř	0	0000	0221	4 245,40
Celkem						4 245,40

*Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.*

Důvodová zpráva

(R-46544)

k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi HMP a obchodní společností COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Tento tisk je Radě HMP předkládán v souvislosti s vypořádáním Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006946/2020 ze dne 2. 12. 2020. Smlouva byla uzavřena mezi HMP (dále jen „Objednatel“) a obchodní společností COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „Zhotovitel“). Předmětem Smlouvy o dílo byla realizace nového chodníku mezi MČ Praha – Kbely a MČ Praha – Vinoř.

Zhotovitel provedl celý předmět Smlouvy o dílo. V průběhu provádění Díla bylo na základě nových požadavků MČ Praha 19 a MČ Praha Vinoř doplněno Dílo o vícepráce, na jejichž základě došlo k vypuštění z realizace Díla některých méněprací. Na základě takto vzniklých víceprací a méněprací došlo ke změně Předmětu Díla, Ceny díla, konkrétně k jeho rozšíření o nutné vícepráce v hodnotě 3 202 564,68 Kč bez DPH a k jeho zmenšení o méněpráce v hodnotě -1 088 135,83 Kč bez DPH. Celkově se jedná o navýšení ceny Díla (vícepráce – méněpráce) v hodnotě **2 114 428,85 Kč bez DPH (tj. 19,43 % z celkové hodnoty zakázky)** ve členění 2 163 156,85 Kč bez DPH pro část Díla ve správě MČ a -48 728,00 Kč bez DPH pro část Díla ve správě THMP. **Celkový cenový nárůst změny je 39,44 % ceny Díla bez DPH.**

Smluvní strany však včas neuzavřely dodatek ke Smlouvě o dílo, který by zohledňoval výše uvedené nutné změny. Dílo bez vad a nedodělků bylo Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato na základě předávacího protokolu ze dne 11. 7. 2022.

Objednatel je dále povinen na základě této Dohody zaplatit Zhotoviteli za provedené a neuhrazené práce dle Smlouvy o dílo (tzn. do fakturace provedených stavebních prací) ve výši **1 394 159,18 Kč bez DPH** ve členění 1 147 829,14 Kč bez DPH pro část Díla ve správě MČ a 246 330,04 Kč bez DPH pro část Díla ve správě THMP.

Hodnota provedených a neuhrazených prací a hodnota dodatečných víceprací činí celkem **3 508 588,03 Kč bez DPH**, tj. **4 245 391,52 Kč včetně DPH**, v členění 3 310 985,99 Kč bez DPH pro část Díla ve správě MČ a 197 602,04 Kč bez DPH pro část ve správě THMP.

Lze předpokládat, že pokud by Objednatel neuhradil Zhotoviteli prokazatelně provedené a neuhrazené práce a hodnota dodatečné vícepráce, Zhotovitel by byl nucen domáhat se svého nároku soudní cestou a podat na Objednatele žalobu o zaplacení dlužné částky, čímž by případně vznikly Objednateli další vícenáklady v podobě soudních nákladů, náklady právního zastoupení včetně náhrady protistrany, úroků z prodlení či smluvních pokut.

Z výše uvedených důvodů je Radě HMP předložena dohoda o narovnání č. DOH/21/08/007512/2022.

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 nebyla schválena dohoda o narovnání v roce 2022, tak jak bylo předpokládáno, a s ní spojené čerpání, žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 02 z roku 2022 do roku 2023 ve výši 4 245,4 tis. Kč u investiční akce č. 3145 TV Vinoř.

Financování dohody o narovnání bude zajištěno z rozpočtu INV MHMP, kap. 02; ORJ 0221, Odd. §3633; POL 6121; ORG 03145000000 pro rok 2023 částkou 4 245 391,52 Kč.

Přílohy důvodové zprávy:

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo

Příloha č. 2 – Posudek odhadce

Příloha č. 3 – Tabulka zasmluvněnosti
